

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 01</b>	<b>DATUM:</b> 23.2.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		

**Účastníci:**

Kordinátor BOZP: [obrazek]

Zástupce zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o.: p. [obrazek], p. [obrazek]

Viz příloha č. 1

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [obrazek]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

- 1.2.1** Plán BOZP – zpracován dne 18.1.2021 koordinátorem BOZP – [obrazek]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele SCOMMODUM, spol., který zajistí seznámení svých pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu budou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 1.2.2** Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval [obrazek]

- Provádění hydroizolací foliemi z měkčeného PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub

- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání
- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken
- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelně seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

### 3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)

1.3.1 Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

### 4. Kontrola zabezpečení staveniště

1.4.1 Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Trvale

### 5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření


### 6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky

1.6.1 Pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – oděv s vysokou viditelností, ochrannou přilbu

Opatření: Používat předepsané OOPP

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

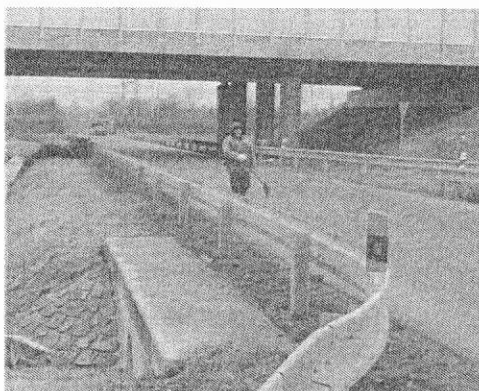

- 1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků  
**Opatření:** Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu

**Odpovídá:** p. [signature]

**Termín:** Neprodleně



- 1.6.3** Nedostatečně zajištěný výkop proti pádu osob u hlavní komunikace a odbočce na ČOV  
**Opatření:** Zajištění zábranou lze použít pouze ve vzdálenosti větší než 1,5 od hrany výkopu

**Odpovídá:** p. [signature]

**Termín:** Neprodleně



## 7. Zjištěná nebezpečí a rizika

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.


Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 796 061  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

**Příloha č. 1 prezenční listina**



	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 02</b>	<b>DATUM:</b> 23.3.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: 29.3.2021		

**Účastníci:**

Kordinátor BOZP: [obrazek]

Zástupce zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o.: p. [obrazek], p. [obrazek]

Viz příloha č. 1

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

- 1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.**

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [obrazek] p. [obrazek]

- 2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

1.2.2 Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval Ing. [obrazek]:

- Provádění hydroizolací foliemi z měkčeného PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub
- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání
- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken

- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelné seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

**Odpovídá:** [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

**23.3.2021 Zástupce zhotovitele doloží prokazatelné seznámení všech pracovníků s technologickými postupy (včetně subdodavatelů, kteří budou provádět práce dle těchto postupů)**

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

- 2.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [REDAKCE]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [REDAKCE] (tel. 777 [REDAKCE], který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 2.2.2** Dne 16.3.2021 bylo aktualizováno Oznámení o zahájení prací. Stejnopis Oznámení byl předán zástupci zhotovitele Commodu spol. s.r.o., který zajistí jeho zveřejnění na staveništi ČOV.

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

- 2.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně

### 3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)

- 1.3.1** Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

**Odpovídá:** p. [REDAKCE] **Termín:** Neprodleně  
23.3.2021 Nespíněno


### 4. Kontrola zabezpečení staveniště

- 1.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Trvale

19.3.2021 kontrola zajištění staveniště v mimopracovní době – bez závad

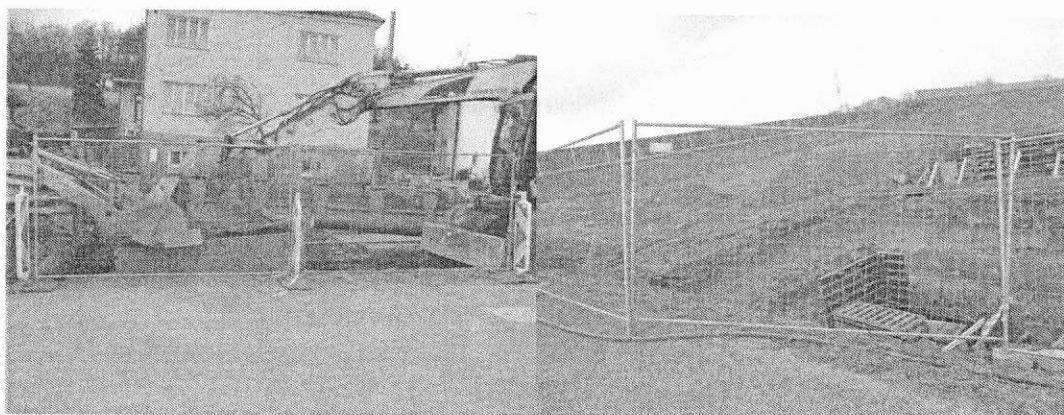

### 5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření

2.5.1 Při pažení výkopů používat dostatek pažicích boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá p. [obrazek]

Termín: Trvale



### 6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky

1.6.1 Pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – oděv s vysokou viditelností, ochrannou přilbu

Opatření: Používat předepsané OOPP


Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

23.3.2021 Částečně splněno – pracovníci nepoužívají ochranné přilby

Odpovídá: p. [obrazek], p. [obrazek]


Termín: Neprodleně

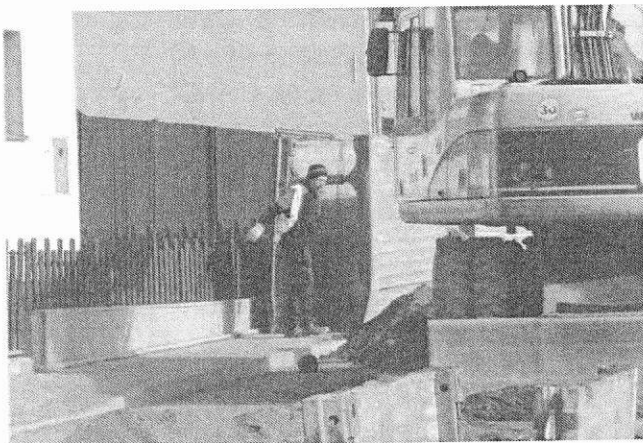

- 1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků  
 Opatření: Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu

**Odpovídá:** p. [obrazek] p. [obrazek]  
 23.3.2021 Nesplněno

**Termín:** Neprodlené

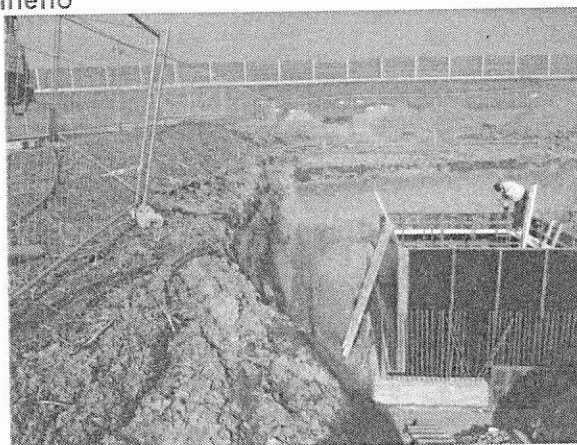

- 1.6.3** Nedostatečně zajištěný výkop proti pádu osob u hlavní komunikace a odbočce na ČOV  
 Opatření: Zajištění zábranou lze použít pouze ve vzdálenosti větší než 1,5 od hrany výkopu

**Odpovídá:** p. [obrazek]  
 23.3.2021 Nesplněno

**Termín:** Neprodlené

- 2.6.1** 23.3.2021 Provedena kontrola prováděných prací - bez nových závad

### 7. Zjištěná nebezpečí a rizika

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě



hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.


Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]@prosafety.cz



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

**Příloha č. 1 prezenční listina**



	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 03</b>	<b>DATUM:</b> 9.4.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: 29.3.2021		

**Účastníci:**

Kordinátor BOZP: [obrazek]

Zástupce zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o.: p. [obrazek], p. [obrazek]

Viz příloha č. 1

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [obrazek] p. [obrazek]
Miloslav [obrazek]		
SORESINA TRADE s.r.o.		

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP****1.2.2 Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval [obrazek]**

- Provádění hydroizolací foliemi z měkčeného PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub
- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání

- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken
- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelné seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně

23.3.2021 Zástupce zhotovitele doloží prokazatelné seznámení všech pracovníků s technologickými postupy (včetně subdodavatelů, kteří budou provádět práce dle těchto postupů)

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně

9.4.2021 Nesplněno

- 2.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [REDACTED] Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [REDACTED] (tel. 777 [REDACTED], který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 2.2.2** Dne 16.3.2021 bylo aktualizováno Oznámení o zahájení prací. Stejnopis Oznámení byl předán zástupci zhotovitele Commodu spol. s.ro., který zajistí jeho zveřejnění na staveništi ČOV.

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně

9.4.2021 Splněno

- 2.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Trvale

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně

9.4.2021 Nesplněno

### 3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)

- 1.3.1** Zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodleně


9.4.2021 Splněno

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**3.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: p. [QR]


Termín: Trvale

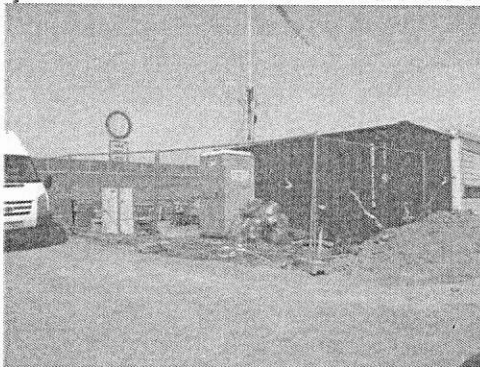**9.4.2021 kontrola zajištění staveniště – staveniště ČOV bez závad**

Nedostatečně zajištěné staveniště proti vstupu nepovolaných osob a pádu osob do výkopu na začátku obce – **zajistit** staveniště oplocením vysokým 1,8 m a označit zákazem vstupu na staveniště

Odpovídá: p. [QR]

Termín: Neprodleně

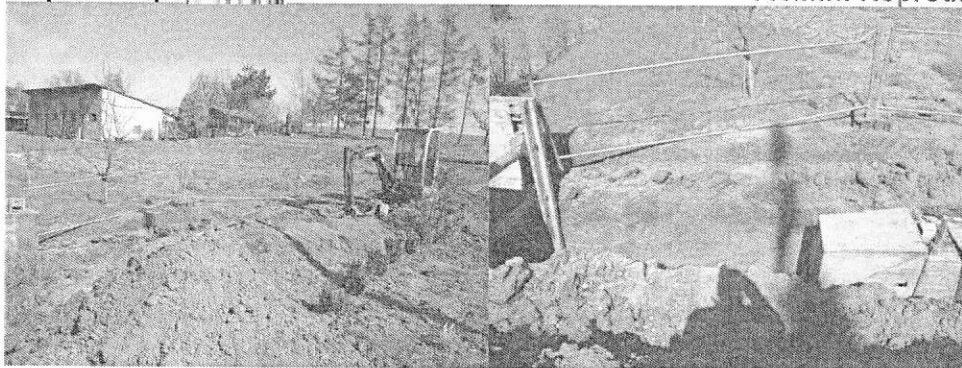**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá p. [QR]

Termín: Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

**1.6.1** Pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – oděv s vysokou viditelností, ochrannou přilbu

Opatření: Používat předepsané OOPP

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

23.3.2021 Částečně splněno – pracovníci nepoužívají ochranné přilby

Odpovídá: p. [obrazek], p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

9.4.2021 nekontrolováno

**1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků

Opatření: Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu

Odpovídá: p. [obrazek], p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

9.4.2021 Nesplněno

**1.6.3** Nedostatečně zajištěný výkop proti pádu osob u hlavní komunikace a odbočce na ČOV

Opatření: Zajištění zábranou lze použít pouze ve vzdálenosti větší než 1,5 od hrany výkopu

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

9.4.2021 Splněno

**3.6.1 9.4.2021** Provedena kontrola prováděných prací - bez nových závad

**7. Zjištěná nebezpečí a rizika**


**1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

**1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

**1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele

**1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.


Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

**Příloha č. 1 prezenční listina**



	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 04</b>	<b>DATUM:</b> 20.4.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště

Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“

Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno

**Účastníci:**

Koordinátor BOZP: [obrazek]

Zástupce zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o.: p. [obrazek] p. [obrazek]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

**1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.**

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [obrazek]
Miloslav [obrazek]	Výkopové práce	p. [obrazek]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	p. [obrazek]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

1.2.2 Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval Ing. [obrazek]

- Provádění hydroizolací foliemi z měkčeného PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub
- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání

- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken
- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelné seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

**Odpovídá:** p. [REDACTED]  
23.3.2021 Zástupce zhotovitele doloží prokazatelné seznámení všech pracovníků s technologickými postupy (včetně subdodavatelů, kteří budou provádět práce dle těchto postupů)

**Termín:** Neprodleně

**Odpovídá:** p. [REDACTED]  
9.4.2021 Nesplněno  
20.4.2021 Nesplněno

**Termín:** Neprodleně

- 2.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [REDACTED]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [REDACTED] ([REDACTED]), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

**Odpovídá:** p. [REDACTED]  
Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

**Termín:** Neprodleně

- 2.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

**Odpovídá:** p. [REDACTED]

**Termín:** Trvale

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

**Odpovídá:** p. [REDACTED],  
9.4.2021 Nesplněno  
20.4.2021 Nesplněno

**Termín:** Neprodleně

### **3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

- 4.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

**Odpovídá:** p. [REDACTED]

**Termín:** Neprodleně



**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**4.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

**Odpovídá:** odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

**Termín:** Trvale

Nedostatečně zajištěné staveniště proti vstupu nepovolaných osob a pádu osob do výkopu na začátku obce – zajistit staveniště oplocením vysokým 1,8 m a označit zákazem vstupu na staveniště

**Odpovídá:** p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**20.4.2021 výkop zasypán, zajištění staveniště bez závad**

**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

**Odpovídá** odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

**Termín:** Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

**1.6.1** Pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – oděv s vysokou viditelností, ochrannou přilbu

Opatření: Používat předepsané OOPP

**Odpovídá:** p. [obrazek]


**Termín:** Neprodleně

23.3.2021 Částečně splněno – pracovníci nepoužívají ochranné přilby

**Odpovídá:** p. [obrazek], p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**20.4.2021 COMMODUM, spol. s r. o. splněno**

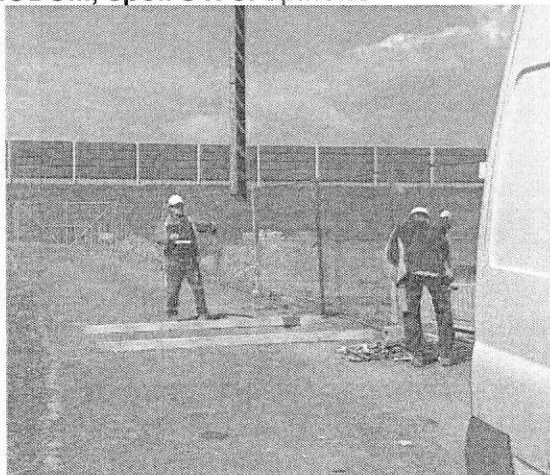

- 1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků  
Opatření: Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu  
Odpovídá: p. [REDACTED], p. [REDACTED]  
20.4.2021 Nesplněno **Termín:** Neprodleně

- 4.6.1** Pracovníci zhotovitele SORESINA TRADE s.r.o. nepoužívají předepsané OOPP – ochranná přilba  
Opatření: používat předepsané OOPP dle schváleného Plánu BOZP  
Odpovídá: p. [REDACTED] **Termín:** Neprodleně



- 4.6.1** Pracovníci zhotovitele [REDACTED] nepoužívají předepsané OOPP – ochranná přilba  
Opatření: používat předepsané OOPP dle schváleného Plánu BOZP  
Odpovídá: p. [REDACTED] **Termín:** Neprodleně



## 7. Zjištěná nebezpečí a rizika

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami

provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 05</b>	<b>DATUM:</b> 6.5.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

**Účastníci:**

Kordinátor BOZP: Jan [obrazek]

Zástupce zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o.: p. [obrazek]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [obrazek]
[obrazek]	Výkopové práce	[obrazek]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[obrazek]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

1.2.2 Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval Ing. [obrazek]

- Provádění hydroizolací foliemi z měkčeného PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub
- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání

- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken
- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelné seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodlené

23.3.2021 Zástupce zhotovitele doloží prokazatelné seznámení všech pracovníků s technologickými postupy (včetně subdodavatelů, kteří budou provádět práce dle těchto postupů)

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodlené

6.5.2021 Nesplněno

- 2.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – J. [redacted]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [redacted] (tel. 777 [redacted] 951), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodlené

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 2.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Trvale

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodlené

9.4.2021 Nesplněno

6.5.2021 Nesplněno

### **3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

- 5.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodlené

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**5.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

**Termín:** Trvale

Nedostatečně zajištěné staveniště proti vstupu nepovolaných osob a pádu osob do výkopu na začátku obce – zajistit staveniště oplocením vysokým 1,8 m a označit zákazem vstupu na staveniště

Odpovídá: p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**6.5.2021 bez závad**

**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

**Termín:** Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

**1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků

Opatření: Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu

Odpovídá: p. [obrazek], p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**6.5.2021 Nesplněno**

**4.6.1** Pracovníci zhotovitele SORESINA TRADE s.r.o. nepoužívají předepsané OOPP – ochranná přilba

Opatření: používat předepsané OOPP dle schváleného Plánu BOZP

Odpovídá: p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**6.5.2021 Nesplněno**



4.6.1 Pracovníci zhotovitele Miloslav Matuš nepoužívají předepsané OOPP – ochranná přilba

Opatření: používat předepsané OOPP dle schváleného Plánu BOZP

Odpovídá: p. [REDACTED]

Termín: Neprodlené

6.5.2021 Splněno



## 7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1.7.1 Pohyb strojů a techniky – **Nevstupovat** do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

1.7.2 Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – **Nezasahovat** do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací **prokazatelně** seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

1.7.3 Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se **nesmí pohybovat** v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele

1.7.4 Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]




Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 06</b>	<b>DATUM:</b> 18.5.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

Účastníci:

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	
	Výkopové práce	
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	



## 2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP

1.2.2 Zhotovitel COMMODUM, spol. s r. o. předložil technologické postupy pro provádění prací z 1/2021, které vypracoval Ing. [REDAKCE]

- Provádění hydroizolací foliemi z měkkého PVC
- Montáž prefabrikovaných konstrukcí
- Stavba prefabrikovaných vodotěsných nádrží
- Opevňování svahů
- Stavba vodotěsných monolitických nádrží
- Stavba potrubí z ocelových trub
- Povrchové úpravy betonových konstrukcí, nátěry
- Betonářské práce
- Stavba vodovodního a kanalizačního potrubí
- Stavba potrubí z litinových trub
- Zemní práce
- Pažení
- Řízené horizontální vrtání
- Montáže šachet a uličních vpustí 13
- Pokládka zámkové dlažby
- Instalace plastových oken
- Frézování vozovkových vrstev za studena
- Směrové kácení stromů
- Zděné konstrukce
- Postup montáže lešení
- Pozemní komunikace

Zástupce zhotovitele provede před zahájením prací prokazatelné seznámení zaměstnanců s technologickými postupy.

Odpovídá: p. [REDAKCE]

Termín: Neprodleně

23.3.2021 Zástupce zhotovitele doloží prokazatelné seznámení všech pracovníků s technologickými postupy (včetně subdodavatelů, kteří budou provádět práce dle těchto postupů)

Odpovídá: p. [REDAKCE]

Termín: Neprodleně

18.5.2021 Nesplněno

2.2.1 Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – Jan [REDAKCE]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [REDAKCE] [REDAKCE] (tel. [REDAKCE] 630 [REDAKCE], který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [REDAKCE]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

2.2.3 Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [REDAKCE], [REDAKCE]

Termín: Trvale

2.2.4 Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

Odpovídá: p. [REDAKCE]

Termín: Neprodleně

9.4.2021 Nesplněno

18.5.2021 Nesplněno

**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**5.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**5.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

18.5.2021 bez závad

**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

**1.6.2** Nejsou dodrženy bezpečné sklony svahů dle předloženého technologického postupu pro zemní práce bod 14. Hrozí uvolnění svahu a zasypání pracovníků

Opatření: Při svahování výkopů postupovat dle předloženého technologického postupu

Odpovídá: p. [obrazek] p. [obrazek]

Termín: Neprodlené

18.5.2021 Svah zajištěn



- 4.6.1 Pracovníci zhotovitele SORESINA TRADE s.r.o. nepoužívají předepsané OOPP – ochranná přilba

Opatření: používat předepsané OOPP dle schváleného Plánu BOZP

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

18.5.2021 Splněno



## 7. Zjištěná nebezpečí a rizika

- 1.7.1 Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- 1.7.2 Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- 1.7.3 Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele

- 1.7.4 Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.

- 6.7.1 Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvíhací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolované.

Bc. [redacted]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z

X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 07</b>	<b>DATUM:</b> 3.6.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

**Účastníci:**

KOO BOZP: [redacted]

Zástupce zhotovitele: p. [redacted]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	[redacted]
[redacted]	Výkopové práce	[redacted]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[redacted]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

- 7.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [redacted]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [redacted] [redacted] (tel. [redacted]), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 7.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Trvale

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny


Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

**3.6.2021 Nesplněno**

**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**7.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. 

Termín: Neprodleně

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**7.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

**3.6.2021 – bez závad**

**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

**3.6.2021 – bez závad**

**7. Zjištěná nebezpečí a rizika**

**1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

**1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

**1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele

- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.
- 6.7.1** Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvihací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolovány.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel. [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 08</b>	<b>DATUM:</b> 18.6.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

**Účastníci:**

KOO BOZP: [obrazek]

Zástupce zhotovitele: p. [obrazek]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	[obrazek]
[obrazek]	Výkopové práce	[obrazek]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[obrazek]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

- 8.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [obrazek]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [obrazek] [obrazek] (tel. [obrazek] 951), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 8.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [obrazek] [obrazek]

Termín: Trvale

- 2.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

Odpovídá: p. [obrazek]

Termín: Neprodleně


9.4.2021 Nesplněno

18.6.2021 Nesplněno



**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**8.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. 

Termín: Neprodleně

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**8.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale


**18.6.2021** Nedostatečně zajištěné staveniště, výkop proti pádu osob v obci

Opatření: Výkopy zajišťovat mobilním oplocením tak, aby bylo zabráněno pádu osob do výkopu

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín:


Trvale

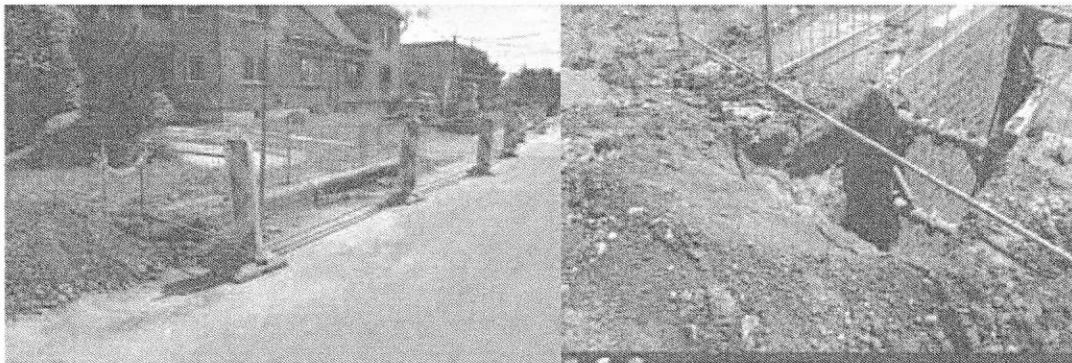**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

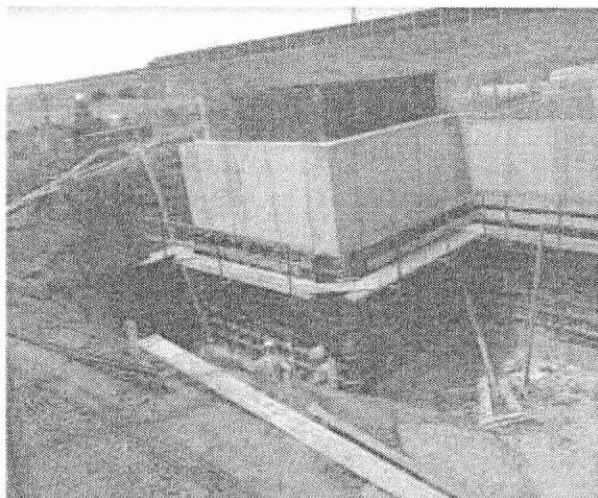**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky****18.6.2021 Bez podstatných závad****7. Zjištěná nebezpečí a rizika**

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.
- 6.7.1** Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvihací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolované.

Bc.   
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732   
e-mail: 



Vysvětlení označení položek X.Y.Z

X.....pořadové číslo zápisu

Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)

Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 09</b>	<b>DATUM:</b> 30.6.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

### Účastníci:

KOO BOZP: [redacted]

Zástupce zhotovitele: p. [redacted]

### Program:

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. **Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.**

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [redacted]
[redacted]	Výkopové práce	[redacted]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[redacted]

## 2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP

- 9.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [redacted]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [redacted] [redacted] (tel. 777 [redacted] 951), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 9.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Trvale

- 9.2.4** Zhotovitel předloží „systém bezpečné práce“ pro použití jeřábu a manipulaci s břemeny

Odpovídá: p. [redacted],


Termín: Neprodleně

9.4.2021 Nesplněno

30.6.2021 Splněno

**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**9.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. 

Termín: Neprodlené

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**8.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.


Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

18.6.2021 Nedostatečně zajištěné staveniště, výkop proti pádu osob v obci

Opatření: Výkopy zajišťovat mobilním oplocením tak, aby bylo zabráněno pádu osob do výkopu

30.6.2021 staveniště během provádění prací zajištěno střežením pracovníků

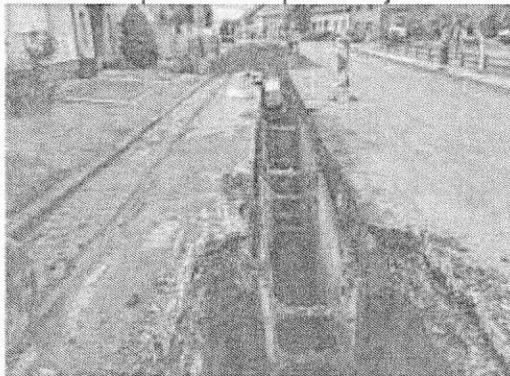**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky****30.6.2021 Provedena kontrola prováděných prací – bez závad****7. Zjištěná nebezpečí a rizika**

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.
- 6.7.1** Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvíhací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolované.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z

X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 10</b>	<b>DATUM:</b> 13.7.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

**Účastníci:**

KOO BOZP: [redacted]

Zástupce zhotovitele: p. [redacted]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

**1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.**

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	[redacted]
[redacted]	Výkopové práce	[redacted]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[redacted]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

**9.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [redacted]. Plán [redacted] byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [redacted] (tel. 777 [redacted], který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

**9.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Trvale



**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**10.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. [obrazek]


Termín: Neprodleně

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**10.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1  
13.7.2021 bez závad

Termín: Trvale

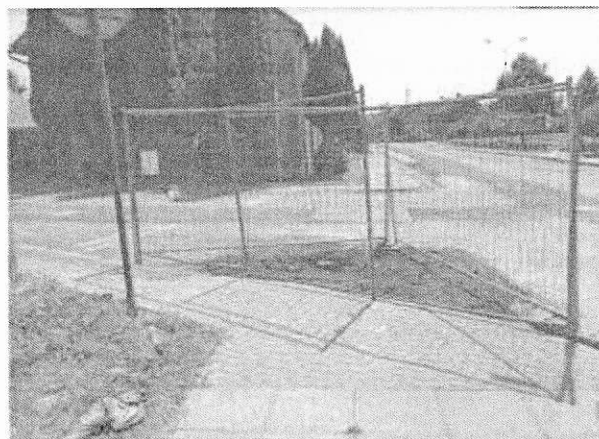**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**


**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

Termín: Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

- 10.6.1 Pracovníci zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o. nepoužívají ochranné přilby**  
Opatření: používat ochranné přilby dle Plánu BOZP a technologických postupů  
Odpovídá: p. [REDAKCE], p. [REDAKCE]

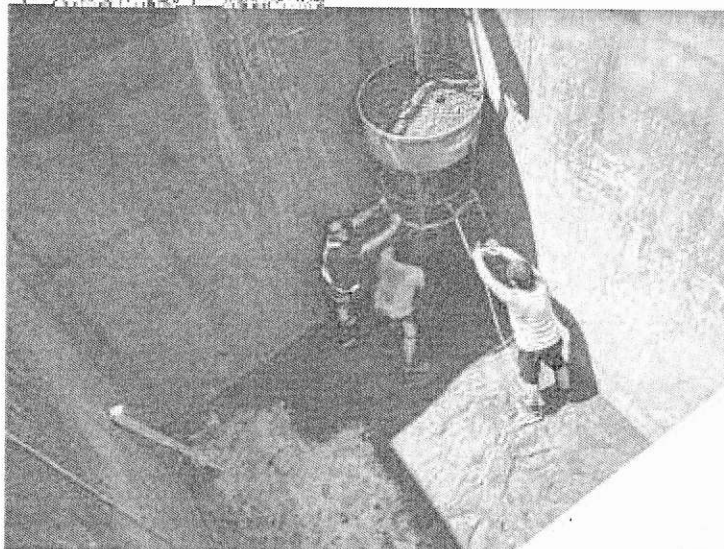**7. Zjištěná nebezpečí a rizika**

- 1.7.1** Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou omezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- 1.7.2** Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- 1.7.3** Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4** Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.
- 6.7.1** Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvíhací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolovány.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**

	<b>ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE BOZP č. 11</b>	<b>DATUM:</b> 27.7.2021
		<b>MÍSTO:</b> Staveniště
Stavba: „ČOV a kanalizace Buk“		
Termín příštího KD BOZP: bude upřesněno		

**Účastníci:**

KOO BOZP: [redacted]

**Program:**

1. Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP
2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP
3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)
4. Kontrola zabezpečení staveniště
5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření
6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky
7. Zjištěná nebezpečí a rizika

1. **Koordinace spolupráce hlavního zhotovitele a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP.**

Zhotovitel	Činnost na stavbě	Pověřená osoba
COMMODUM, spol. s r. o.	Hlavní zhotovitel	p. [redacted]
[redacted]	Výkopové práce	p. [redacted]
SORESINA TRADE s.r.o.	Výkopové práce	[redacted]

**2. Dokumentace, kontrola dodržování Plánu BOZP**

- 11.2.1** Plán BOZP – byl dne 19.3.2021 aktualizován koordinátorem BOZP – [redacted]. Plán BOZP byl v tištěné podobě předán zástupci zhotovitele COMMODUM, spol. – [redacted] (tel. 777 [redacted] 951), který zajistí seznámení pracovníků na staveništi s Plánem BOZP.

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Neprodleně

Volnou přílohou Plánu jsou doložené informace o pracovních a technologických postupech zhotovitelů, které pro realizaci stavby zvolili, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

- 11.2.3** Hlavní zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat Koordinátora BOZP o nástupu svých nových subdodavatelů

Odpovídá: p. [redacted]

Termín: Trvale

**3. Průběh prací na staveništi – stanovení času k provádění prací (harmonogram)**

**11.3.1** Zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP harmonogram prací pro stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností – bez připomínek

Odpovídá: p. [obrazek]

**Termín:** Neprodleně

**4. Kontrola zabezpečení staveniště**

**10.4.1** Staveniště ČOV bude oploceno mobilním oplocením vysokým 1,8 m. Kanalizační stoky a ostatní pracovní místa v zastavěném území budou zajištěna mobilními plotovými dílci výšky minimálně 1,8m. Krátkodobé práce a práce mimo zastavěné území obce lze výjimečně zajistit jinou vhodnou zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, zamezující vstupu na staveniště (násyp zeminy výšky 0,9 m, bezpečnostní značení – výstražná páska, dílcové zábrany...). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Odpovídá: odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1  
27.7.2021 bez závad

**Termín:** Trvale

**5. Koordinace bezpečnostních opatření, podněty a technická opatření**

**2.5.1** Při pažení výkopů používat dostatek pažících boxů, tak aby pracovníci nevstupovali do nezapaženého výkopu.

Odpovídá odpovědné osoby zhotovitelů viz. bod 1

**Termín:** Trvale

**6. Kontrola staveniště a prováděných prací, zjištěné závady a nedostatky**

- 10.6.1 Pracovníci zhotovitele COMMODUM, spol. s r. o. nepoužívají ochranné přilby  
Opatření: používat ochranné přilby dle Plánu BOZP a technologických postupů  
Odpovídá: p. [redacted] p. [redacted] Termín: Neprodleně  
27.7.2021 Nekontrolováno

**10.6.1 Provedena kontrola prováděných prací zhotovitele [redacted] – bez závad****7. Zjištěná nebezpečí a rizika**

- 1.7.1 Pohyb strojů a techniky – Nevstupovat do pracovních prostorů kolem strojů, které jsou vymezeny maximálním dosahem jejich pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.
- 1.7.2 Porušení technické infrastruktury, ochranná pásma – Nezasahovat do ochranných pásem vedení a v případě nutnosti provádění prací v ochranných pásmech je nutné dodržovat podmínky stanovené správcem nebo provozovatelem technické infrastruktury. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- 1.7.3 Sesutí zeminy – strojně kopané výkopy musí být zajištěny proti sesutí stěn výkopu dostatečně pevným pažením. Osoby se nesmí pohybovat v nezapažených výkopech, pokud toto neupravuje technologický postup zhotovitele
- 1.7.4 Zajištění výkopových prací – výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím.
- 6.7.1 Manipulace s břemeny, pád břemene – osoby nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Zdvíhací zařízení smí obsluhovat pouze oprávněná osoba (jeřábník). Provádění uvazování břemen smí provádět pouze oprávněné osoby (vazači) a používané vazací prostředky musí být bez závad a pravidelně kontrolované.

Bc. [REDACTED]  
koordinátor BOZP na staveništi  
tel.: 732 [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]@prosafety.cz



Vysvětlení označení položek X.Y.Z  
X.....pořadové číslo zápisu  
Y.....číslo příslušného oddílu (1-7)  
Z.....číslo položky v rámci oddílu

**Tento zápis je součástí a aktualizací opatření Plánu BOZP na staveništi**
